项目日志

2025 FlowerC

组员1	组员2	组员3	组员4
常如意	李佳浩	李桂昇	褚一满

第一轮

节点一（团队的组建和内容的选定）

8月26日，我们成功组队，第一次开会确定了组名和要做的东西(HTML学习网站)，明确分工，并建立了微信群方便及时沟通。




节点二（项目计划、任务表、网站设计图等初步文件的确立）


9月1日，我们创建了大致的任务表并整理成Excel，讨论初步探索了Git与Gitee并建好了小组gitee库，初步探讨了技术实现问题（决定基本可以全部使用前端实现HTML、CSS、javascript）。

周数	总任务	李佳浩(PM)	常如意(UI/资料)	李桂昇(程序员)	褚一满(主程序员)
1	确定网站内容，组员任务分配，网站框架初步建立	寻求组员意见，篡写项目计划进行网站的内容初步规划与设计	寻找需要的图片音频等资源进行网站视觉设计	检查并完善网站教学部分的代码	编写网站的教学部分的框架代码
2					
3	完善教学部分代码，并添加前两个章节的内容，初步探索用户系统	完善任务表与项目计划，进行用户系统的功能探索与内容设计，寻找前两章节的教学资料	设计教学部分的关卡界面(教学的第二、三级页面以及教学与答题共同的四级页面)，寻找所需的图片及教学资料	检查并完善网站教学部分的代码	依照设计编写网站的教学部分的代码
4					
5	制作用户系统(存档功能的上线)，完善教学内容的前六个章节				
6					
7	制作收集系统(包括金币与精灵球商店的上线)，完善教学部分前八个章节				
8					
9	完善前面三个部分的内容，制作教学部分第九章				
10	制作抽奖系统，完善收集系统(宝可梦图鉴的初步上线)，				
11					

9月2日，我们合力讨论完成了初版的项目计划word文档（虽然没有根据第四章内容不合格）

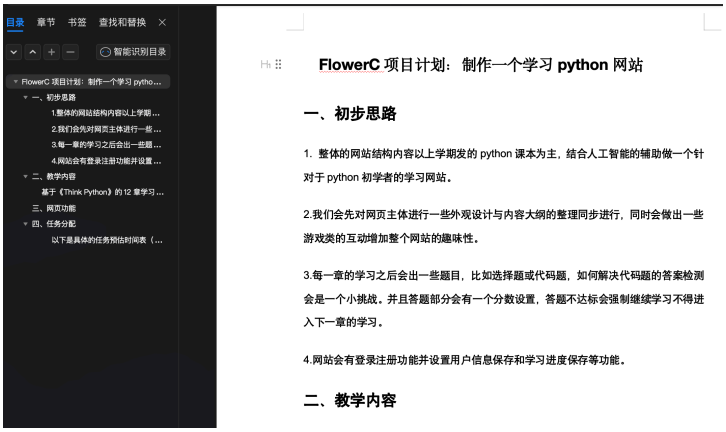



9月8日，我们的网站页面设计图出炉，进行一些初步的资源整理后开始按照设计图纸与教授提供的资料进行网站框架的搭建

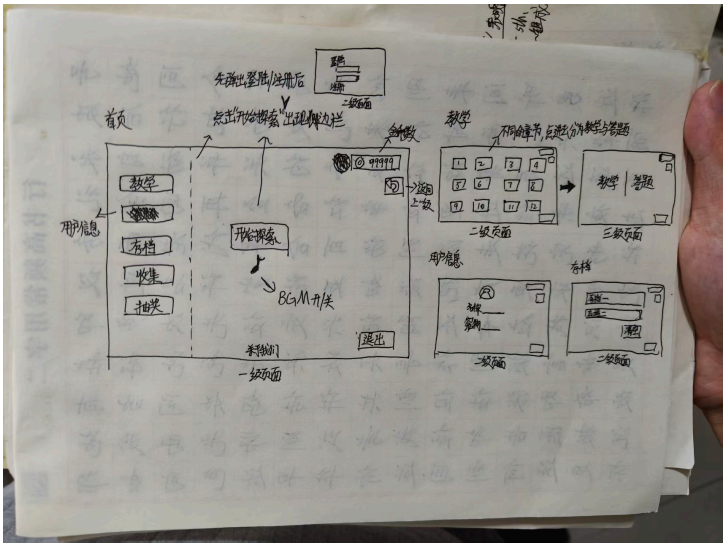

节点三（网页内容的制作与功能的实现）

9月9日，已经制作出了首页和登录/注册界面的页面，我们在上课时制作了项目启动ppt并进行展示，更加明确了需要完成的内容与软件工程课程的教学目的。创建了Github库。

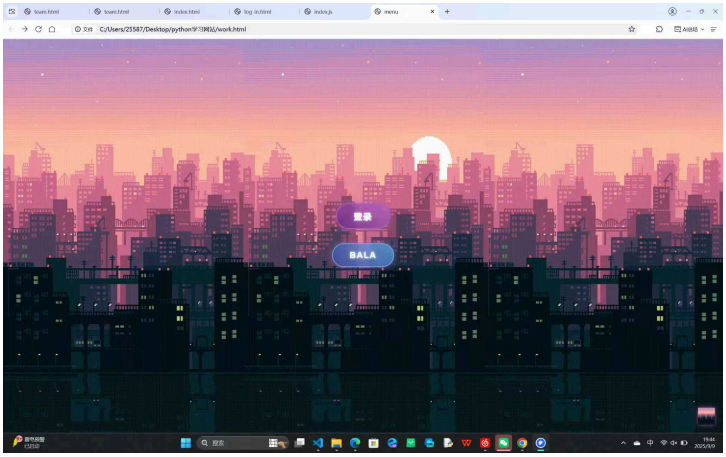


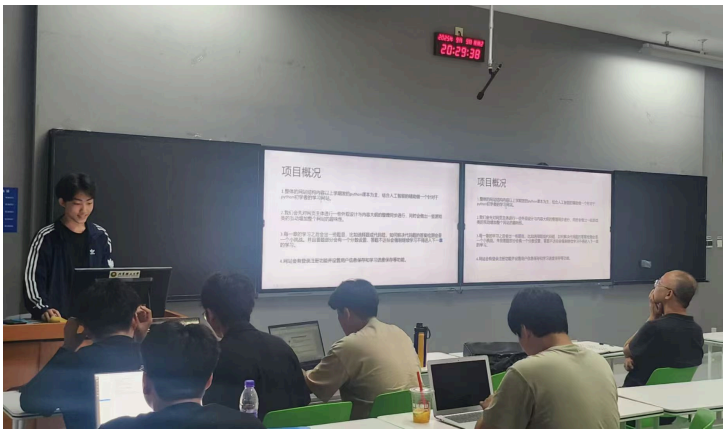


9月16日，教授提出修改计划的三轮为两轮，我们在这周更新了任务表，对每周和每轮的任务目标进行了调整同时进一步分工，准备同时进行用户界面以及教学界面的制作

周数	总任务	李佳浩(PM)	常如意(UI/资料)	李桂昇(程序员)	褚一清(主程序员)
1 2	确定网站内容，组员任务分配， 网站框架初步建立	寻求组员意见，篡写项目计划 进行网站的内容初步规划与设计	寻找需要的图片音频等资源 进行网站视觉设计	检查并完善网站教学部分的代码	编写网站的教学部分的框架代码
3 4	完善教学部分代码，并添加前两个章节的内容，初步探索用户系统	完善任务表与项目计划，进行 用户系统的功能探索与内容设计，寻找前两章节的教学资料	设计教学部分的关卡界面(教学的第二、三级页面以及教学与答题共同的四级页面)，寻找所需的图片及教学资料	检查并完善网站教学部分的 代码	依照设计编写网站的教学部分 的代码
5 6	制作用户系统(存档功能的上线)，完善教学内容的 前八个章节				
7 8	完善用户系统，上线答题检测功能				
9 10	制作收集系统(包括金币与精灵球商店的上线)				
11 12	制作抽奖系统，完善收集系统(宝可梦图鉴的初步上线)，				
13	增加可获取的宝可梦种类，进行				


9月23日，我们完成了菜单和教学部分第一级页面的制作，同时借助人工智能，使用indexedDB实现了登录/注册功能可用

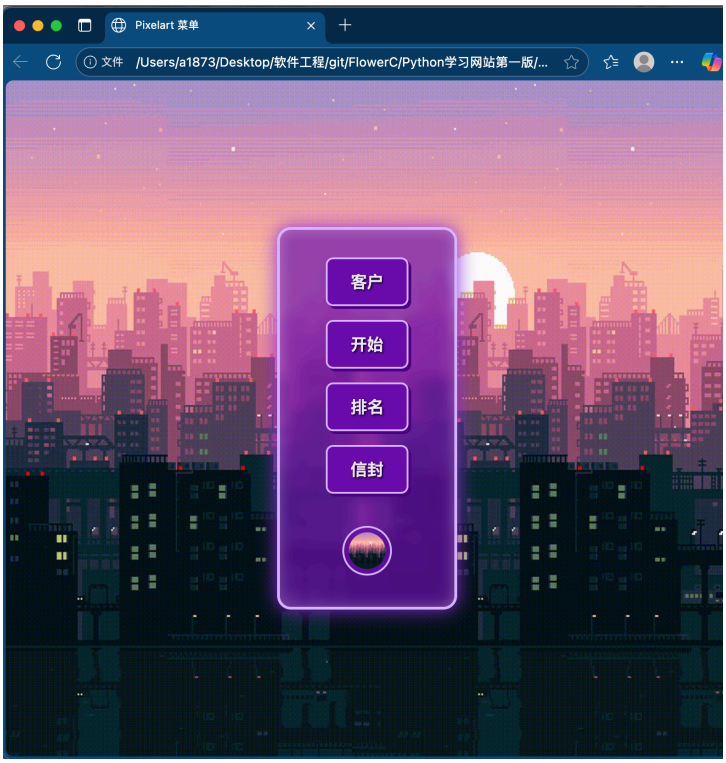



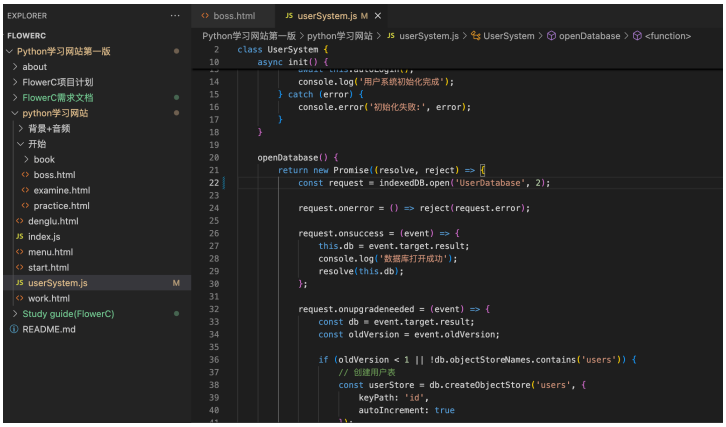


9月27日，我们修改完善了项目计划，制作了需求文档以及study guide的前三个章节

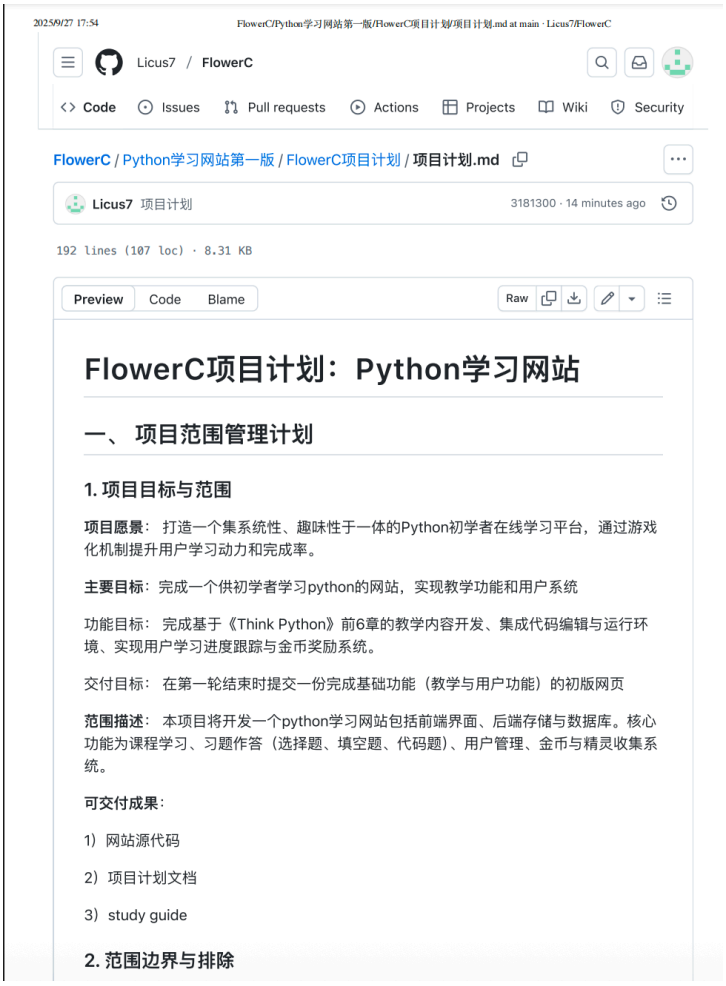



10月17日，明天就是第一轮的截止时间，虽然主力军即将考试，人手有些短缺，但我们还是完成了：在网站方面：主界面，登录/注册界面，教学界面和用户功能。软件工程文档方面：第一版的Study guide，需求文档，设计文档，测试文档，当然还有本篇记录。





在此第一轮制作就完工了，组员都很辛苦也很用功，希望我们能享受过程，学习技能，做出让自己开心的作品

以下为打分表

组员	贡献	得分
李佳浩	记录了小组制作过程，并制作了一些文档，实现了登录与注册功能	95
常如意	设计了各级界面的排版布局，内容与功能，查找了图片等必要资源	100
李桂昇	修改完善了项目计划，制作了用户存储功能js，用户界面html	100
褚一满	制作了主界面，登录/注册界面，教学界面，测试简化了js代码	100

第二轮

第二轮会议记录在此处：

会议日期（2025）	参会人员	会议内容	决议事项	是否完成
10月21日	全员	第二轮制作内容商讨与第一轮回顾	明确了第二轮将会制作的内容	已完成
10月28日	全员	解决任务分配问题	编码任务补位给没有ppt任务的同学	已完成
11月4日	全员	同步制作目标与进度	继续ppt同时编码不耽误进度	已完成
11月18日	全员	进度同步与制作内容讨论	将金币与精灵待定， 优先完成用户系统，准备ppt展示	已完成
11月25日	全员	网站剩余制作内容讨论	新增用户进度界面， boss界面玩家扣血	待完成
12月9日	全员	最终汇报内容讨论		

节点四（需求ppt展示，软件工程文档与study guide完成）

10月21日，课上进行了第一轮的成果总结，以及第二轮的具体安排。新增了一项小组ppt的展示，我们选择了聚焦于需求章进行设计，并确定了主要负责的组员，明确了分工。在网站制作与软件工程文档方面，我们组已经有了第一版的基础与经验，准备在这一轮优化

10	9	制作章节练习与boss界面， 制作需求部分ppt，并准备展示	设计制作章节练习与 boss界面	设计改进章节练习与 boss界面内容与功能， 并提出建议	美化前端网页，开发 用户功能	制作需求ppt，准备展示
11	10					
12	11	展示需求ppt，完成study guide 以及软件工程文档第二版	完善软件工程文档， 完善study guide， 出期末模拟题	设计金币框与精灵相关 界面如抽奖界面和仓 库，找图片音频资源	制作用户进度功能， 检测代码漏洞，完善测 试文档	展示ppt，制作用户个人 进度查看功能
13	12					
14	13	制作收集系统(包括金币与 精灵球商店的上线) 制作抽奖系统，完善收集系统 (宝可梦图鉴的初步上线)，	完善软件工程文档， 协助制作系统	设计金币框与精灵相关 界面如抽奖界面和仓 库，找图片音频资源	检测金币与精灵系统， 完善study guide与测试 文档	制作金币与精灵系统
15	14					
16	15	完善网站功能性与完整性 回顾制作经历，准备演示作品 与文稿，进行展示	完善文档与代码， 最后一节课展示项目 成果内容	检查各页面风格	完善文档，检查代码， 完成最终测试文档	完善代码
17	16					


10月28日，小组会议后调整了分工，由于原编写代码的同学要进行需求ppt的制作，编码任务进行了补位，并开始了新的网站设计

11月4日，小组ppt制作中，同时调整了start网页结构，只留下教学、练习和boss。依照教学章节的格式完成了练习界面，实现了进度管理，前一章节做完才可进入下一章练习，且用户每次登录不会丢失以往练习进度。优化了教学界面与练习界面的视觉效果



11月11日，本周最终测试也就是boss界面完成，ppt也取得了很多进展，即将完成。boss界面由一张图片而诞生，将最终测试设计成了游戏一般的体验，从“纸上谈兵”到最后成品可以运行的那一刻，成就感又何尝没有具像化。




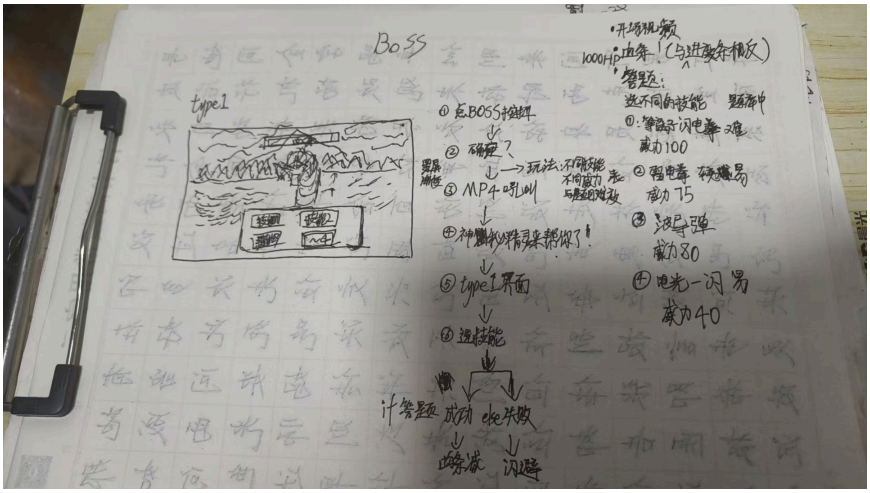



11月18日，ppt已经完成并进行提前预演，由于新增任务以及进度原因暂时决定游戏化功能搁置，准备优先制作用户查询进度的功能界面

11月25日，课上进行了小组ppt展示，网页部分也实现了boss界面玩家答错扣血的功能

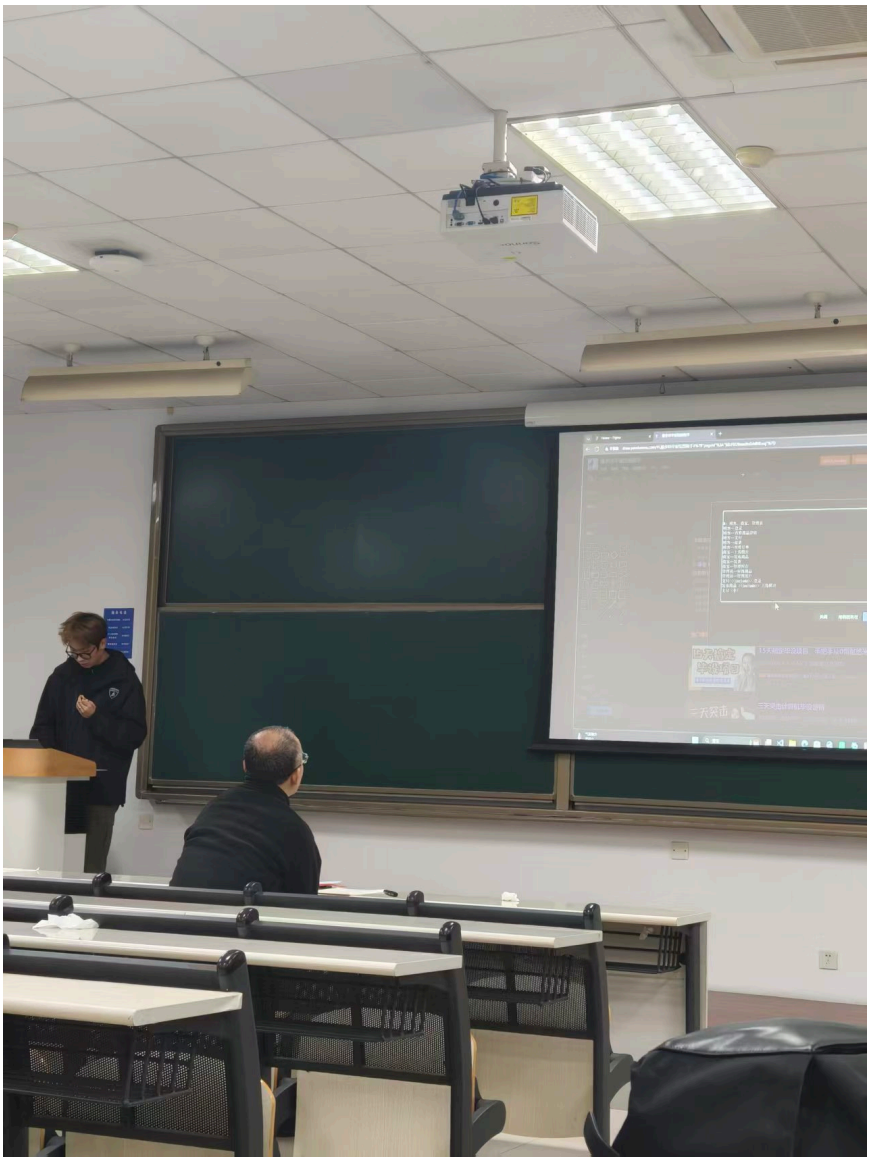



节点五（用户进度查看与游戏化系统的上线）

12月9日，完成了用户系统与练习获得金币


← 返回菜单
角色档案
用户名:
111
编辑
角色ID:
oseuvsouvbsouosijcqssqsQswdawdadawdawd
编辑
性别:
男性
编辑
密码:
••••••••
修改


66
金币

最终报告
